



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
C.N.P.J. N° 05.119.854/001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTÁDIO
MUNICIPAL DÉCIO GONÇALVES QUINTAS, BAIRRO
CAPIMARINHO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE
AFUÁ/PA**

**JULHO/2023
AFUÁ-PARÁ**

S 1

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DÉCIO GONÇALVES
QUINTAS, BAIRRO CAPIMARINHO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE
AFUÁ/PA**



Imagem 01 – Cabine de transmissão.

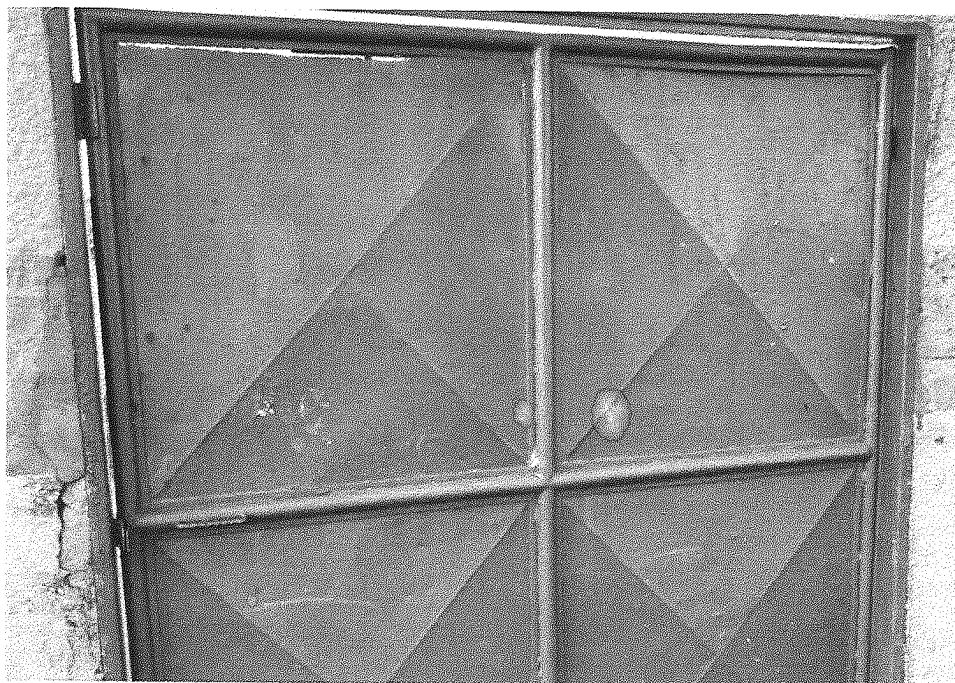


Imagem 02 – Portão de entrada e saída.



Imagem 03 – Tablado em madeira em frente ao estádio.



Imagem 04 – Banco de reservas.



PREFEITURA DE AFUÁ
JUNTOS
TRABALHANDO PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
C.N.P.J. Nº 05.119.854/001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR



Imagem 05 – Banco de reservas.



Imagem 06 – Banheiro do estádio faltando ralo.

87



Imagem 07 – Banheiro do estádio com registro do chuveiro quebrado.



Imagem 08 – Porta de acesso ao vestiário degradada por cupim.



PREFEITURA DE AFUÁ
JUNTOS
TRABALHANDO PELO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
C.N.P.J. N° 05.119.854/001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR



Imagem 09 – Mictório do estádio.



Imagem 10 – Caixa de força.

8

6



Imagem 11 – CALÇADA DE ACESSO AOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS.

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
C.N.P.J. N° 05.119.854/001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR



CONCLUSÃO

Constatou-se in loco e pode ser observada nas imagens o estado do **Estádio Municipal Décio Gonçalves Quintas**, ao qual possui a necessidade de ser feito uma reforma geral no mesmo em sua área interna e externa, os portões de entrada sofreram oxidação e precisam de reparos; os bancos de reservas estão degradados; os banheiros e vestiários precisam de uma descumpinização, de troca de revestimentos cerâmico quebrados tanto do piso quanto da parede, e ainda os vasos sanitários e as caixas acopladas são modelos antigos e estão quebrados; o piso em concreto armado da calçada de acesso aos banheiros precisa de um contra piso; existem alguns pilares com ferros expostos; e a arquibancada precisa de emassamento para cobrir as trincas; o tablado em madeira de entrada mede 120,30mx4,30m está com a madeira desgastada necessitando de um reparo geral, existem aberturas no alambrado; e ainda há a necessidade de colocar uma canaleta na entrada dos portões do estádio, o telhado da cabine de transmissão está com sua trama desgastada e as telhas furadas precisando serem trocadas.

Afuá, 03 de Agosto de 2023.

HAYSSA GONÇALVES DE CARVALHO
ENG. CIVIL CREA-PA 1519958480

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GOMES PANTOJA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
